

PRIVREDNO DRUŠTVO
UNIVERZAL KOP d.o.o.
Бр. 27-00017
Датум: 24. год.
Mirjevski bulevar, Београд



UNIVERZAL KOP
GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO D.O.O.

Adresa: Mirjevski bulevar 88, 11160 Beograd

Erste banka: 340-11016177-75

PIB: 109977856, MB: 21278653

Raiffeisen banka: 265-1060310001514-72

E-mail: office@univerzalkop.rs

Komercijalna banka: 205-243635-78

Šifra: 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada Halk banka: 155-55253-24

KARIN KOMERC MD DOO
Бр. 01/240011418
Датум: 06.04.2024
Нови Сад

ТРЕЋА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА:	24-00017
Датума издавања:	29-03-24
Место издавања:	Београд
Датум промета добара и услуга:	29-03-24
Број дана за плаћање:	30 дана
Датум валуте плаћања:	28-04-24

КУПАЦ:
KARIN KOMERC MD d.o.o. Ветерник, Нови Сад, ПИБ: 103726184 MB: 20009233

Место испоруке: Суботица, Надстрешнице
--

Уговорена вредност: 937.995,44 \$(USD), по уговору бр.
01/230044876, од 13.11.2023 (Наручилац) и 205/23 од 21.11.2023
(Извођач) и по усвојеној понуди 15-11/2023 од 15.11.2023

Редни број	Назив	Пореска основица		Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а		Укупно	
		\$(USD)	PCД		\$(USD)	PCД	\$(USD)	PCД
1.	Укупно изведени радови	93,231.17	1,498,481.81	20%	553.95	60,206.20	96,554.86	1,859,718.98
2.	Укупно изведени радови по претходним ситуацијама	90,461.43	1,197,450.83	20%	0.00	0.00	90,461.43	1,197,450.83
3.	Укупно изведени радови по овој ситуацији (4+5), курс 108,6857	2,769.74	301,030.98	20%	553.95	60,206.20	6,093.42	662,268.15
4.	Укупно изведени радови по овој ситуацији БЕЗ ПДВ-а	2,769.74	301,030.98	20%	0.00	0.00	2,769.74	301,030.98
5.	Укупно изведени радови по овој ситуацији СА ПДВ-ом	2,769.74	301,030.98	20%	553.95	60,206.20	3,323.69	361,237.17
7.	Одбија се аванс по авансном рачуну 15/2023, од 24.11.2023 године	553.95	59,490.83	20%	0.00	0.00	553.95	59,490.83
8.	Задржан депозит 5% од нето радова	138.49	15,051.55	20%	0.00	0.00	138.49	15,051.55
9.	Остаје за наплату по овој ситуацији	2,077.30	226,488.60	20%	553.95	60,206.20	2,631.25	286,694.80

У случају кашњења, рачунамо затезну камату наше пословне банке.

У случају спора надлежан је Привредни Суд у седишту купца.

*Средњи курс НБС на дан фактурисања износи

108.6857 rsd



UNIVERZAL KOP
GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO D. O. O.
Adresa: Mitopolski bulevar 18, 11160 Beograd
E-pošta: mitkop@pob.rs
Telefon: 011 2787860, 011 2787863
Faks: 011 2787863
Šifre: 41200 - Izgradnja zgrade / Nastambeni Zgrade
Hrbarski: 105-02023-4
E-pošta: 105-02023-4

[illegible]

[illegible]

[illegible]


		изведено по претходним ситуацијама		изведено по овој ситуацији		укупно изведено					
		количина		износ		количина		износ			
04. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА		УТОВОРЕНО									
04.01.	Антикорозивну заштиту челичне конструкције извести у смену према одредбама SRPS ISO 12944/2002 за категорију корозивности C5 са веком трајања дужином од 15 година. Изабран је систем епоксид-полиуретан са 2 премаза укупне дебљине 160 µm. Основни премаз дебљине 80 µm је епоксидна боја богата цинком. Два покривна епоксидна премаза су укупне дебљине 160 µm. Завршни премаз је полиуретан дебљине 40 µm. Укупна дебљина свих премаза је 280 µm. Припрему површина извести пескарењем кварцим песком до степена 2 ½ према SIS 055900 (SRPS ISO 12944/2002). Извођач је у обавези да дефинише систем антикорозивне заштите који је компатибилан са захтевима завршном бојом, са одговарајућим сертификатом издатим од стране овлашћеног Института и за то мора добити сагласност Пројектанта и Надзорног органа. Челичну конструкцију завршно бојити у два слоја бојом за метал ANTICO са додатком опилака гвожђа у графитно сивом тону по избору пројектанта типа Fegomiscro или одговарајуће. Тон треба да одговара тону RAL7016 (антрацит сива, Nearest shade as per the NCS standard: S 8005-B20G). У цену улазе и сва спојна средства, завртњи, лимови и сл. Обрачун по кг израђене и финално обрађене конструкције, на основу детаља челика.	kg	60,581.00	2.78	168,415.18	29,013.15	80,656.55	161.71	449.55	29,174.86	81,106.10
укупно Пос 4.1. - надстрешнице 1-5						80,656.55		449.55		81,106.10	
04.	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА-укупно	168,415.18				80,656.55		449.55		81,106.10	

		изведено по претходним ситуацијама		изведено по овој ситуацији		укупно изведено	
		количина	износ	количина	износ	количина	износ
05.	ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА						
05.01.	Набавка материјала и израда перонске надстрешнице гласине у челичној конструкцији. Перонска надстрешница је у делови пројектована као челична конструкција. Основни елементи конструкције су стубови, подужни просекли четириножни репеласте носачи, постављени у оси надстрешнице, и попречни кожни репеласте носачи, постављени обострано у односу на четириножне репеласте носаче. Кожни носачи се састоје од лучних појасних штапова и правоугаоних штапова испуне. Основни размак стубова износи 10,40 метара. Стубови надстрешнице састављени су од четири челица челица профила Ø140мм. На стубовима су остављени отвори за пролаз електричних и телекомуникационих каблова до опреме која је означена на саме надстрешнице (рашети, звучници, информационе табле и ситови). На средњим стубове су у горњој зони са спољне стране зашрапи ослоњци од челичног lima дебљине 10мм који служе за ослањање облоге од пуног полимербита у свему према детаљу. Кроз празни петрачни простор, између вертикалних носачих профила два средњих стуба надстрешнице, пролазе олушне вертикале профила Ø110мм, са реинијром. Олушне вертикале су пројектоване од полиестерских челици типа као SEBERT. Оне олушне вертикале и сам размак челичне канализације надстрешница су предмет посебног пројекта хидротехничких инсталација. Стубови надстрешнице се преко аинер излуче аинерују у АБ темеље саме који се састоје од паглава 40/60/70см и темеље стопе 180/120/40см. Облога надстрешнице постављена је у доњем појасу челичне конструкције и састоји се од комбинације сегмената од пуног полимербита и пуних полукоњакних сегмената испуне са облогом од поликованог lima дебљине 0,7мм у горњој зони и са облогом од алубула дебљине 4мм у доњој зони, у свему према графичкој документацији. Облога надстрешнице (стаклени и пуни делови) су намењени пројектованим иновим носачима означени о зашрапе челици домет појаса ковалних носача, у свему према детаљу. Са унутрашње стране средњих стубови, у зони споја са киншом вертикалом, за стубове се фиксира зашрапањем шпуре од челичног lima, у облику обрнутог слова П спољних димензија 20x20см дебљине 5мм, за прикључање хоризонталног олука. Веса оне челичне шпуре и кортуса хоризонталног олука се састоје зашрапањем. Кортуса хоризонталног олука носети од пох lima дебљине 10мм, у облику обрнутог слова П, спољних димензија 19x19см. Спојне сегмената пох lima обрађати пох лапшама. Унутар пох кортуса се поставља хоризонтални олак од поликованог lima дебљине 0,7 мм састоје под од 0,5% ка олушним вертикалама, у свему према детаљу. Све спојне челица и пох изоловати ради спречавања контакте (галивске) корозије. Челична конструкција надстрешнице је обрађувана у раднома Челична конструкција. Овом позицијом су обухваћене следеће ставке:						

[illegible]

05.01.02.	Набава и уградња транспарентног сегментног дела надстрешнице -пун поликарбонат дебљине 8 мм са обостраном UV заштитом, боја грипо/лим сиво, класа Б1 - тешко гориви материјали. На местима ослањања поликарбоната на алуминијумске носаче поставити EPDM подлошке. За заштитавање користити једнокомпонентне трајно еластичне силиконске масе постојане на температури од -50°C до +180°C и UV зрачење. Обрачун по м²	надстрешница 1 надстрешница 2 надстрешница 3 надстрешница 4 надстрешница 5	м² м² м² м² м²	155,17 261,66 261,66 261,66 22,05	124,16 124,16 124,16 124,16 124,16	119,467,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.03.	укупно Пос.5.1.2. - надстрешнице 1-5 Набава материјала и уградња корпуса хоризонталног олука од inox lima дебљине d=1 мм, у облику обрнутог слова П, спољних димензија 19x19 cm. Спојеве сегмената inox lima обрадити inox лајсанама. Обрачун по кг	надстрешница 1 надстрешница 2 надстрешница 3 надстрешница 4 надстрешница 5	kg kg kg kg kg	304,32 513,98 513,98 513,98 42,24							
05.01.04.	укупно Пос.5.1.3. - надстрешнице 1-5 Набава материјала и израда хоризонталног олука од поцинкованог челичног lima дебљине d=0,7 мм, са падом од 0,5% ка олучним вертикалама, у свему према детаљу, развијене ширине 60 cm, са свим спојним средствима. Обрачун по м².	надстрешница 1 надстрешница 2 надстрешница 3 надстрешница 4 надстрешница 5	м² м² м² м² м²	36,23 61,19 61,19 61,19 5,03							
05.01.05.	укупно Пос.5.1.4. - надстрешнице 1-5 Набава материјала и опшивање крова надстрешнице, на местима гуног дела поцинкованим челичним лимом дебљине d=0,7 мм, развијене ширине 195 cm, са свим спојним средствима. Обрачун по м².	надстрешница 1 надстрешница 2 надстрешница 3 надстрешница 4 надстрешница 5	м² м² м² м² м²	224,82 195,39 325,65 325,65 32,57	36,00	8,093,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	укупно Пос.5.1.5. - надстрешнице 1-5		м²	1204,91	20,73	24,977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		изведено по претходним ситуацијама	изведено по овој ситуацији		укупно изведено
			износ	износ	
01.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0.00	0.00	0.00	
02.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ	4,486.75	1,629.17	6,115.92	
03.	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	1,919.75	691.01	2,610.76	
04.	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА	80,656.55	449.55	81,106.10	
05.	ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА	0.00	0.00	0.00	
УКУПНО :		87,063.04	2,769.74	89,832.78	



Попула број 15-11/2023

Извођење радова на надстрешницама и оградама уз станичну зграду у
Суботици и Наумићевоу
Инвеститор: Карин Комерц МД, д.о.о.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА \$ (USD)		изведено по претходним ситуацијама		изведено по овој ситуацији		укупно изведено
		износ		износ		
1.11.3.	Надстрешница потходника Наумићево	0.00		0.00		0.00
1.12.3.	Надстрешница степеништа и лифт Суботица путничка	0.00		0.00		0.00
1.12.8.	Надстрешница потходника Суботица теретна	0.00		0.00		0.00
9.5.10.	Наумићево перонска ограда	0.00		0.00		0.00
9.5.11.1	Надстрешница Суботица путничка перонска ограда	3,398.39		0.00		3,398.39
9.5.11.2	Суботица путничка перонских надстрешница и надстрешнице за утовар и истовар	87,063.04		2,769.74		89,832.78
УКУПНО :		90,461.43		2,769.74		93,231.17 КОМ.

PD Universal kop d.o.o.



Надзор:



Градилиште: Суботица,
путнички перонони

Инвеститор: "КАРИН КОМЕРЦ МД"
д.о.о


Објект: Перонске надстрешнице и
надстрешнице за утовар и истовар
праћених аутомобила у железничкој
станици Суботица путничка

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 1

Врста рада:	Бетонирање подлоге за израду темеља самца, неармираним бетоном за перон III	Грађ. Норма	Обрачун. нацрта бр.....	Поз. предрачуна. бр. 9.5.11.2-02.01.
Јединична цена: 236 \$ По м³			Мера 1,15	
A =	B =	A + B =	Месечно	Укупно
Пренето: март 2024. Набавка материјала и бетонирање подлоге за израду темеља самца, неармираним бетоном, C12/15, који се лије у слоју дебљине d=10 цм. Обрачун по м³. перон 2 $\text{'= } 1,90 * 1,30 * 8 * 0,01 = 19,76 * 0,01 = 0,1976$			0,20 0,19	0,54
Укупно:			0,20 0,19	0,74 0,73
Извођач радова: 			Надзорни орган: 	
За пренос:				

02.01. Бетонирање подлоге за израду темеља самца, неармираним бетоном, C12/15, који се лије у слоју дебљине $d=10$ цм.

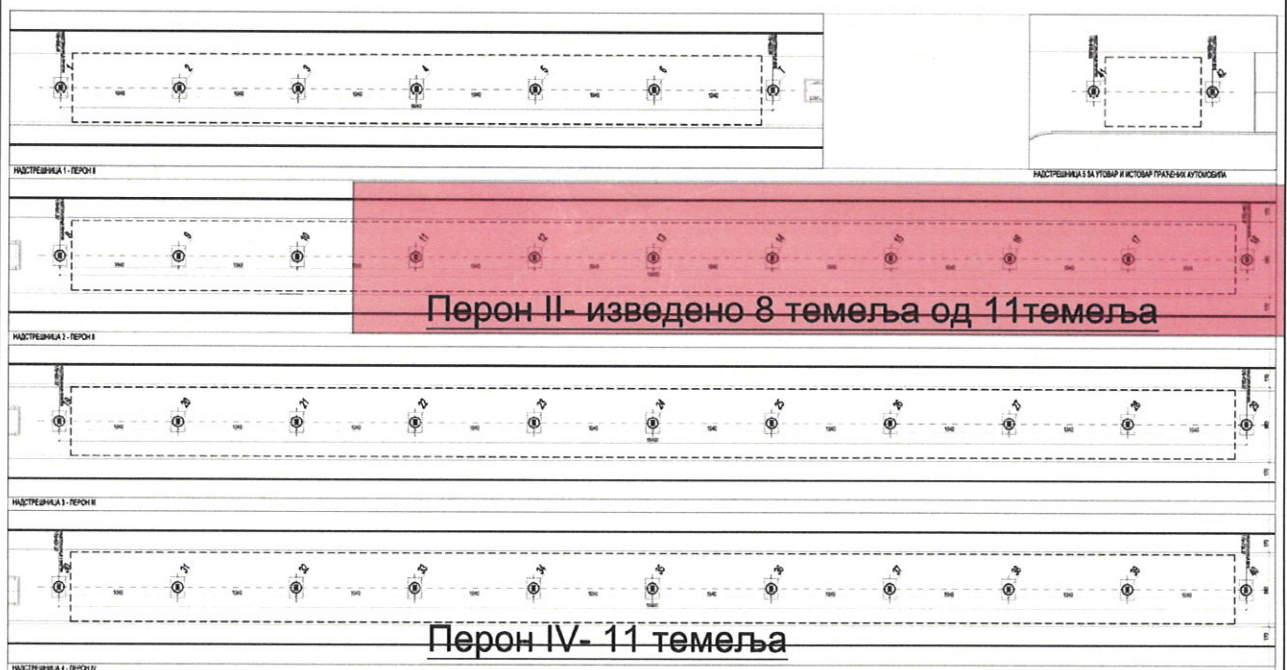


Градилиште: Суботица,
путнички перонони

Инвеститор: "КАРИН КОМЕРЦ МД"
д.о.о


Објект: Перонске надстрешнице и
надстрешнице за утовар и истовар
праћених аутомобила у железничкој
станици Суботица путничка

Обрачунски лист грађевинске књиге



Лист број 2

Врста рада: Бетонирање темеља самаца за стубове надстрешница за перон II	Грађ. Норма Шифра.....	Обрачун. нацрта бр.....	Поз. предрачуна. бр. 9.5.11.2-02.02.	
Јединична цена: 192,04 \$ По м³		Мера 43,34		
A =	B =	A + B =	Месечно	Укупно
Пренето: март 2024. Набавка материјала и бетонирање темеља самаца, армираним бетоном МБ 30 (C25/30) са израдом нише за анкеровање носећих стубова надстрешнице, а у свему према детаљу. Радити у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по м³ са потребном оплатом. Бетонирање за пероне II перон 2 = 1,80*1,20*0,40*8+ 0,40*0,60*0,70*8=6,91+1,34=8,25			8,25	22,70
			Укупно:	8,25
Извођач радова:			Надзорни орган:	
				
За пренос:				

Предмер пројекта 9.5.11.2 Суботица путничка
 02.02. Бетонирање темеља самаца, армираним бетоном МБ 30
 (С25/30) са израдом нише за анкеровање носећих стубова
 надстрешнице

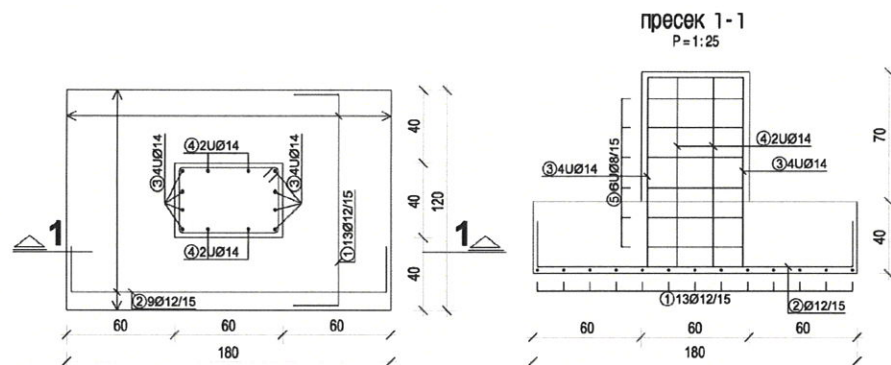

ПОЛОЖАЈ ЦЕВИ У ТЕМЕЉ Т2

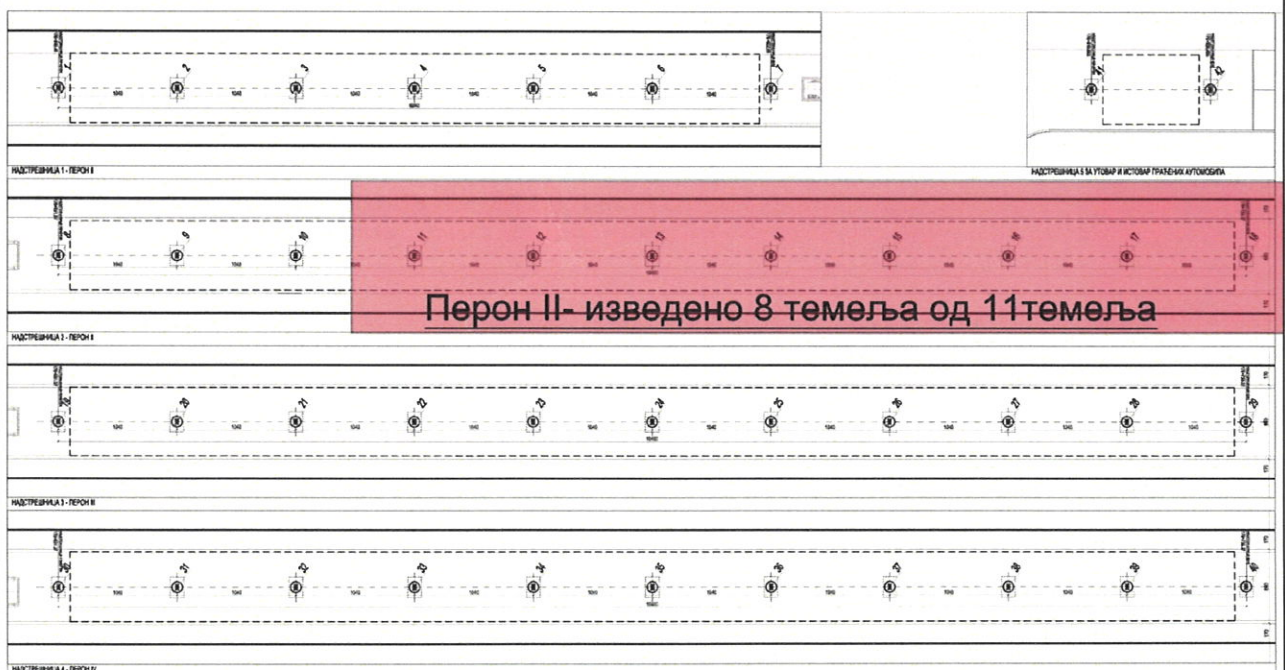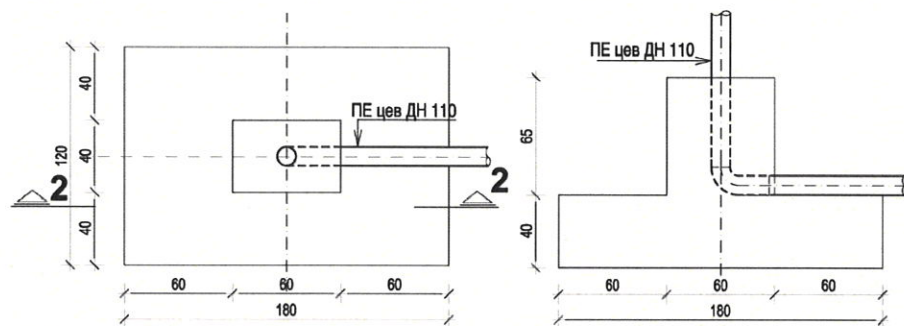

Градилиште: Суботица,
путнички перонони

Инвеститор: "КАРИН КОМЕРЦ МД"
д.о.о

Објект: Перонске надстрешнице и
надстрешнице за утовар и истовар
праћених аутомобила у железничкој
станици Суботица путничка






Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 3

Врста рада:	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре Б500 и МАГ темеља самаца за стубове надстрешница за перон II	Грађ. Норма Шифра.....	Обрачун. нацрта бр.....	Поз. предрачуна. бр. 9.5.11.2-03.01.	
Јединична цена: 1,33 \$ По кг			Мера 2.686,93		
A =	B =	A + B =		Месечно	Укупно
Пренето:					1.443,42
март 2024.					
Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре Б500 и МАГ. Ценом обухватити и дистанцере који фиксирају удаљеност арматуре од оплате. Обрачун по килограму					
Темељи самци за стубове надстрешница за пероне II					
темељна стопа – надстрешница перона 2					
Ø 8 _____ 94,08*0,4=37,63					
Ø 12 _____ 333,60*0,89=296,90					
Ø 14 _____ 139,68*1,21=169,01					
			503,54		
Ø 12 _____ (6*3)*0,89=16,02			16,02		
Укупно:			529,24 519,56		1.972,66 1.962,98
Извођач радова:			Надзорни орган:		
					
За пренос:					

Предмер пројекта 9.5.11.2 Суботица путничка
03.01.04. Армирачки радови за пероне 2

Перон II- 8 темеља

Шипке спецификација					
озн.	облик и мере [cm]	Б500Ø [mm]	lg [m]	n [ком]	lg n [m]
Станица Суботица (8 ком)					
1		12	1.65	104	171,60
2		12	2.25	72	162,00
3		14	3.19	32	102,08
4		14	2.85	16	45,60
5		8	1.96	48	94,08
Шипке - рекалитулација					
Ø [mm]	lg n [m]	Јединична тежина [kg/m]	Тежина [kg]		
Б 500					
8	94,08	0.40	37,63		
12	333,60	0.89	296,90		
14	139,68	1.21	169,01		
Укупно (Б 500)					503,54
Укупно					503,54


Dodatna armatura Ø12 komada 6 po 3m

АРМАТУРА ТЕМЕЉА НАДСТРЕШНИЦЕ Т2

ком.42 Р = 1: 25

пресек 1-1

Р = 1: 25

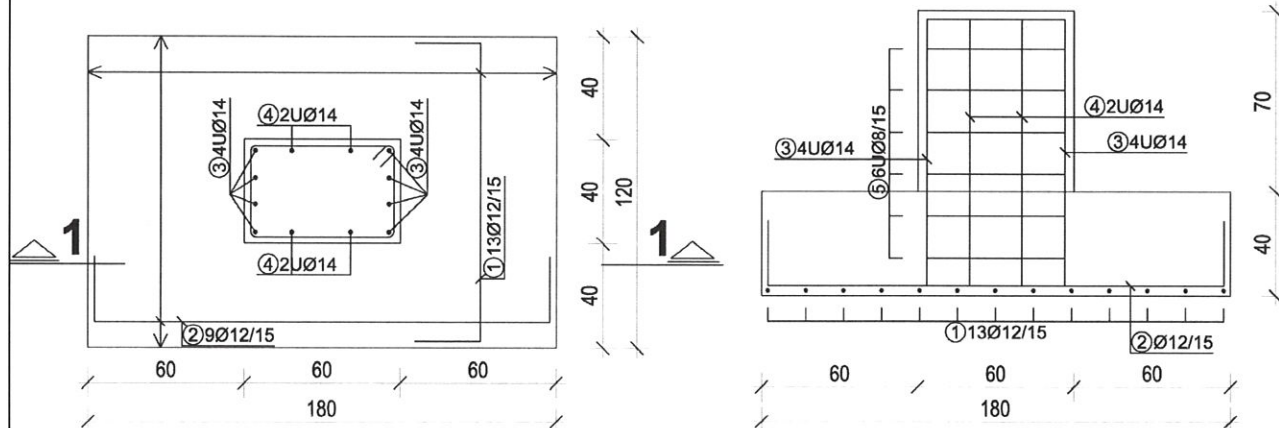

Градилиште: Суботица,
путнички перонони

Инвеститор: "КАРИН КОМЕРЦ МД"
д.о.о

Објект: Перонске надстрешнице и
надстрешнице за утовар и истовар
праћених аутомобила у железничкој
станици Суботица путничка

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 4

Врста рада:	Набавка, израда и монтажа челичних елемената... У цену улазе и сва спојна средства, завртњи, лимови и сл. Обрачун по кг израђене и финално обрађене конструкције, на основу детаља челика.	Грађ. Норма Шифра.....	Обрачун. нацрта бр.....	Поз. предрачуна. бр. 9.5.11.2-04.01.	
Јединична цена: 2,78 \$ По кг			Мера 168.415,18 кг		
A =	B =	A + B =		Месечно	Укупно
Пренето: март 2024.					29.013,15
Набавка, израда и монтажа челичних елемената... Челична конструкција – Анкери I шаблони стубова надстрешнице Анкер M20 са објект надстрешнице тип A. У цену улазе и сва спојна средства, завртњи, лимови и сл. Обрачун по кг израђене и финално обрађене конструкције, на основу детаља челика.					
Анкери и шаблони за темеље самце за стубове надстрешница за пероне III и IV					
Анкер тип A					
M20...1090 28*1,09*2,47			75,38		
Шаблон 400.5..600 7*0,4*0,6*39,25			65,94		
Анкер тип B					
1M20...2220 2*2,22*2,47			10,97		
Шаблон 400.5..600 1*0,4*0,6*39,25			9,42		
Укупно:			161,71		29.174,86
Извођач радова:			Надзорни орган:		
					
За пренос:					
